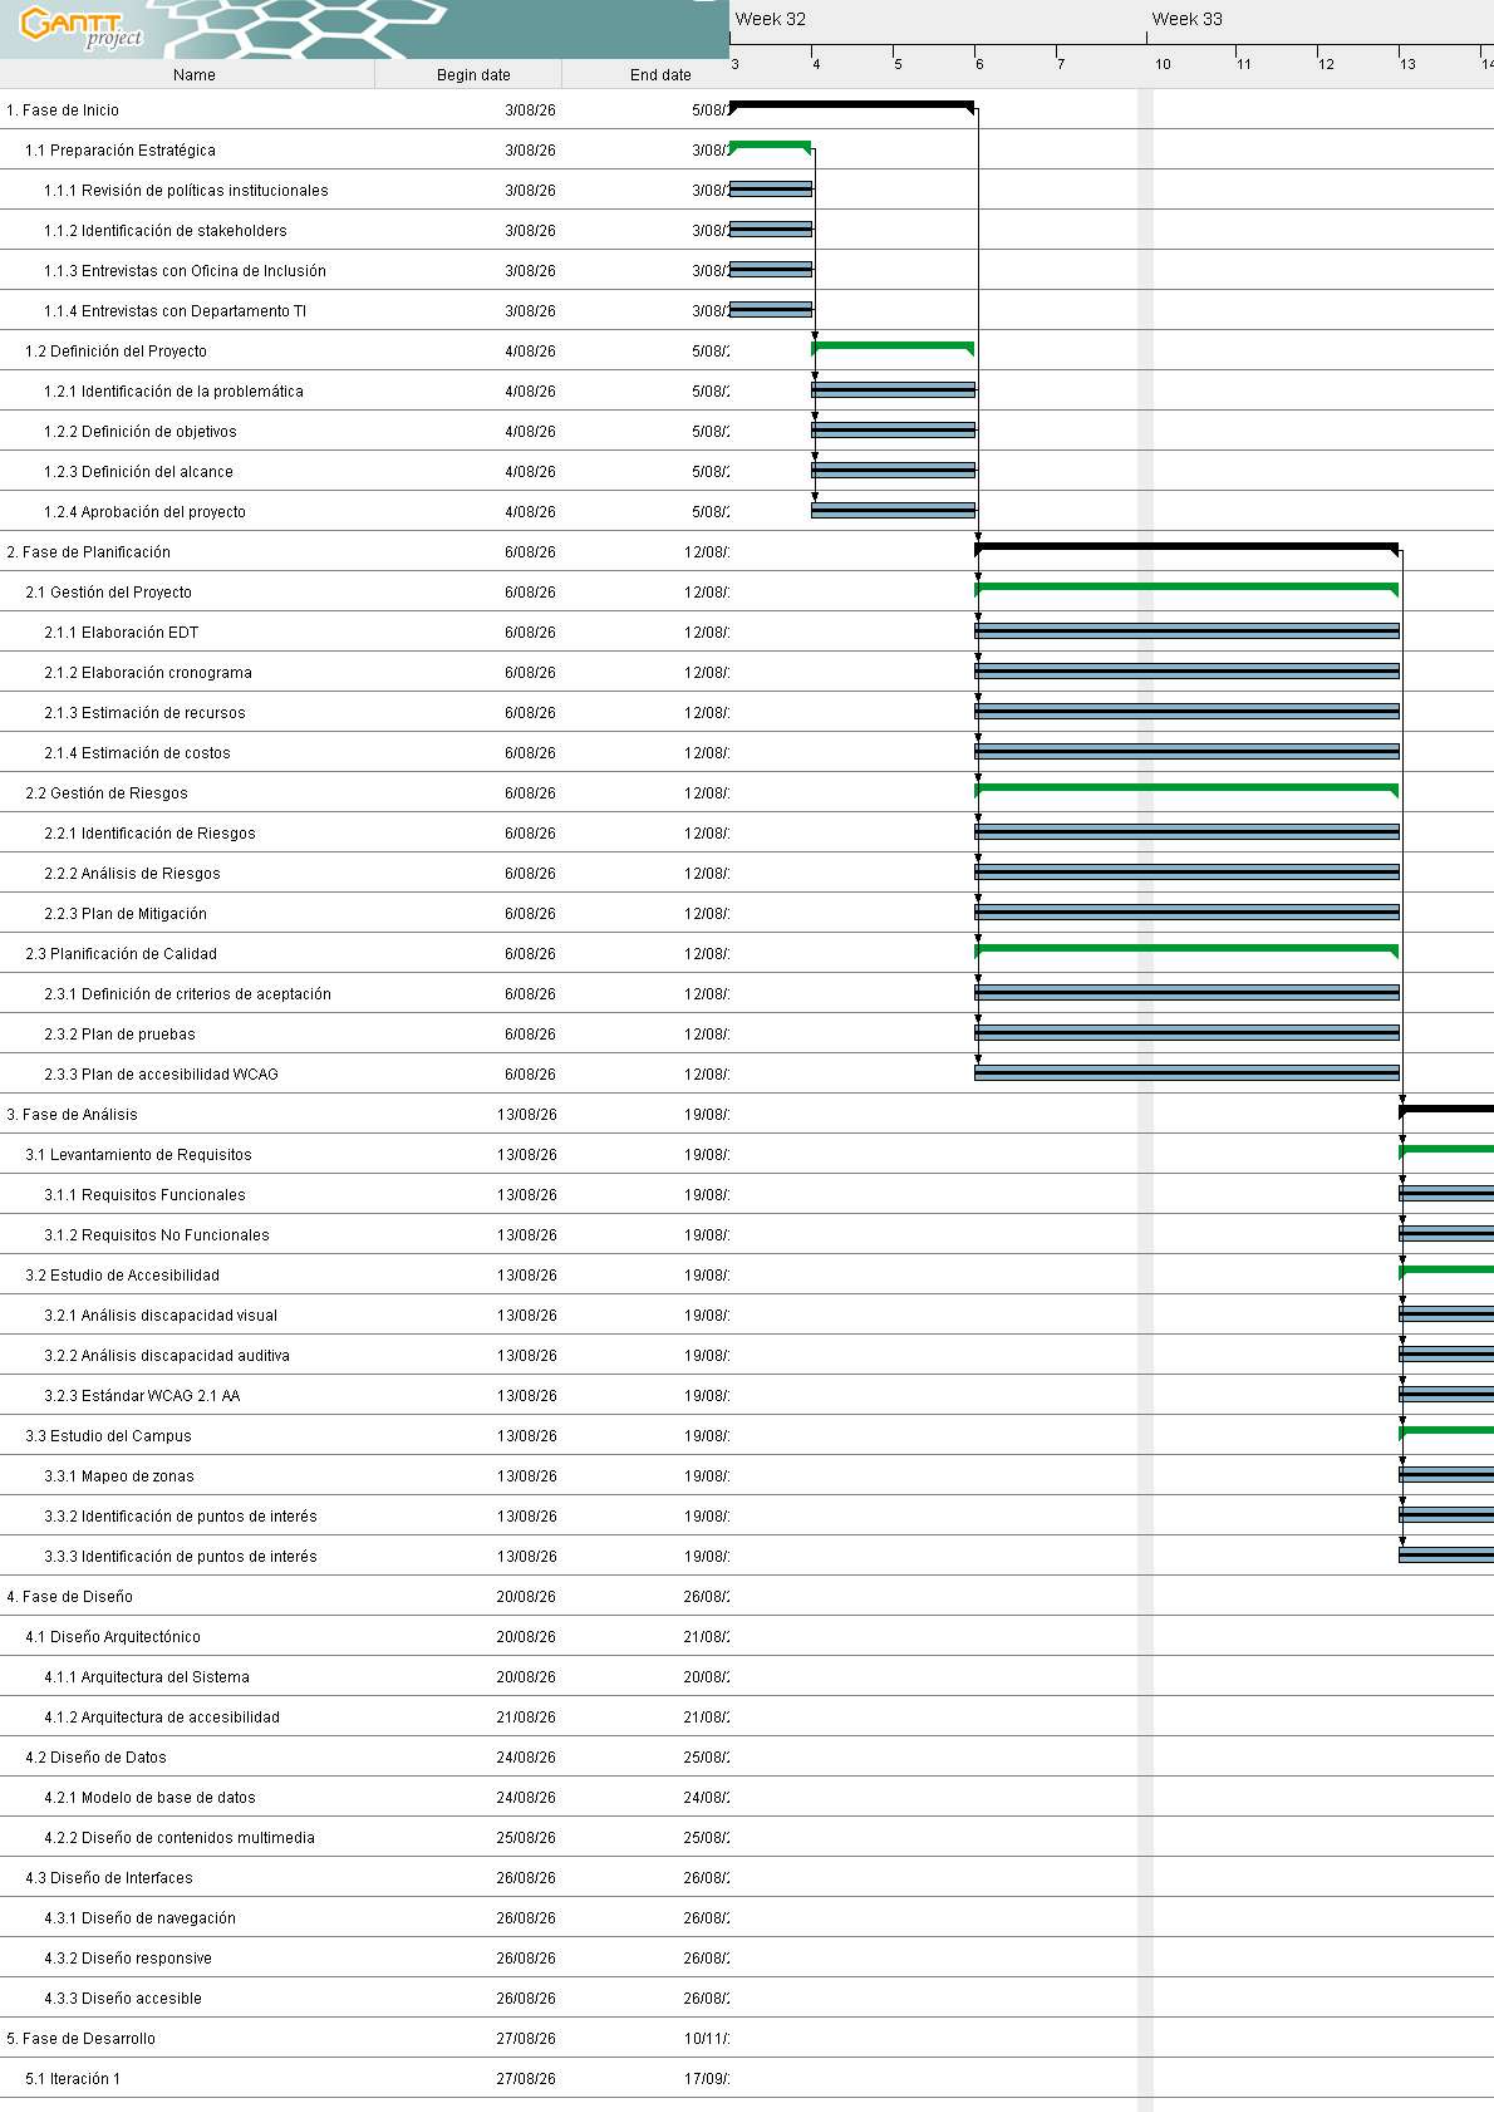
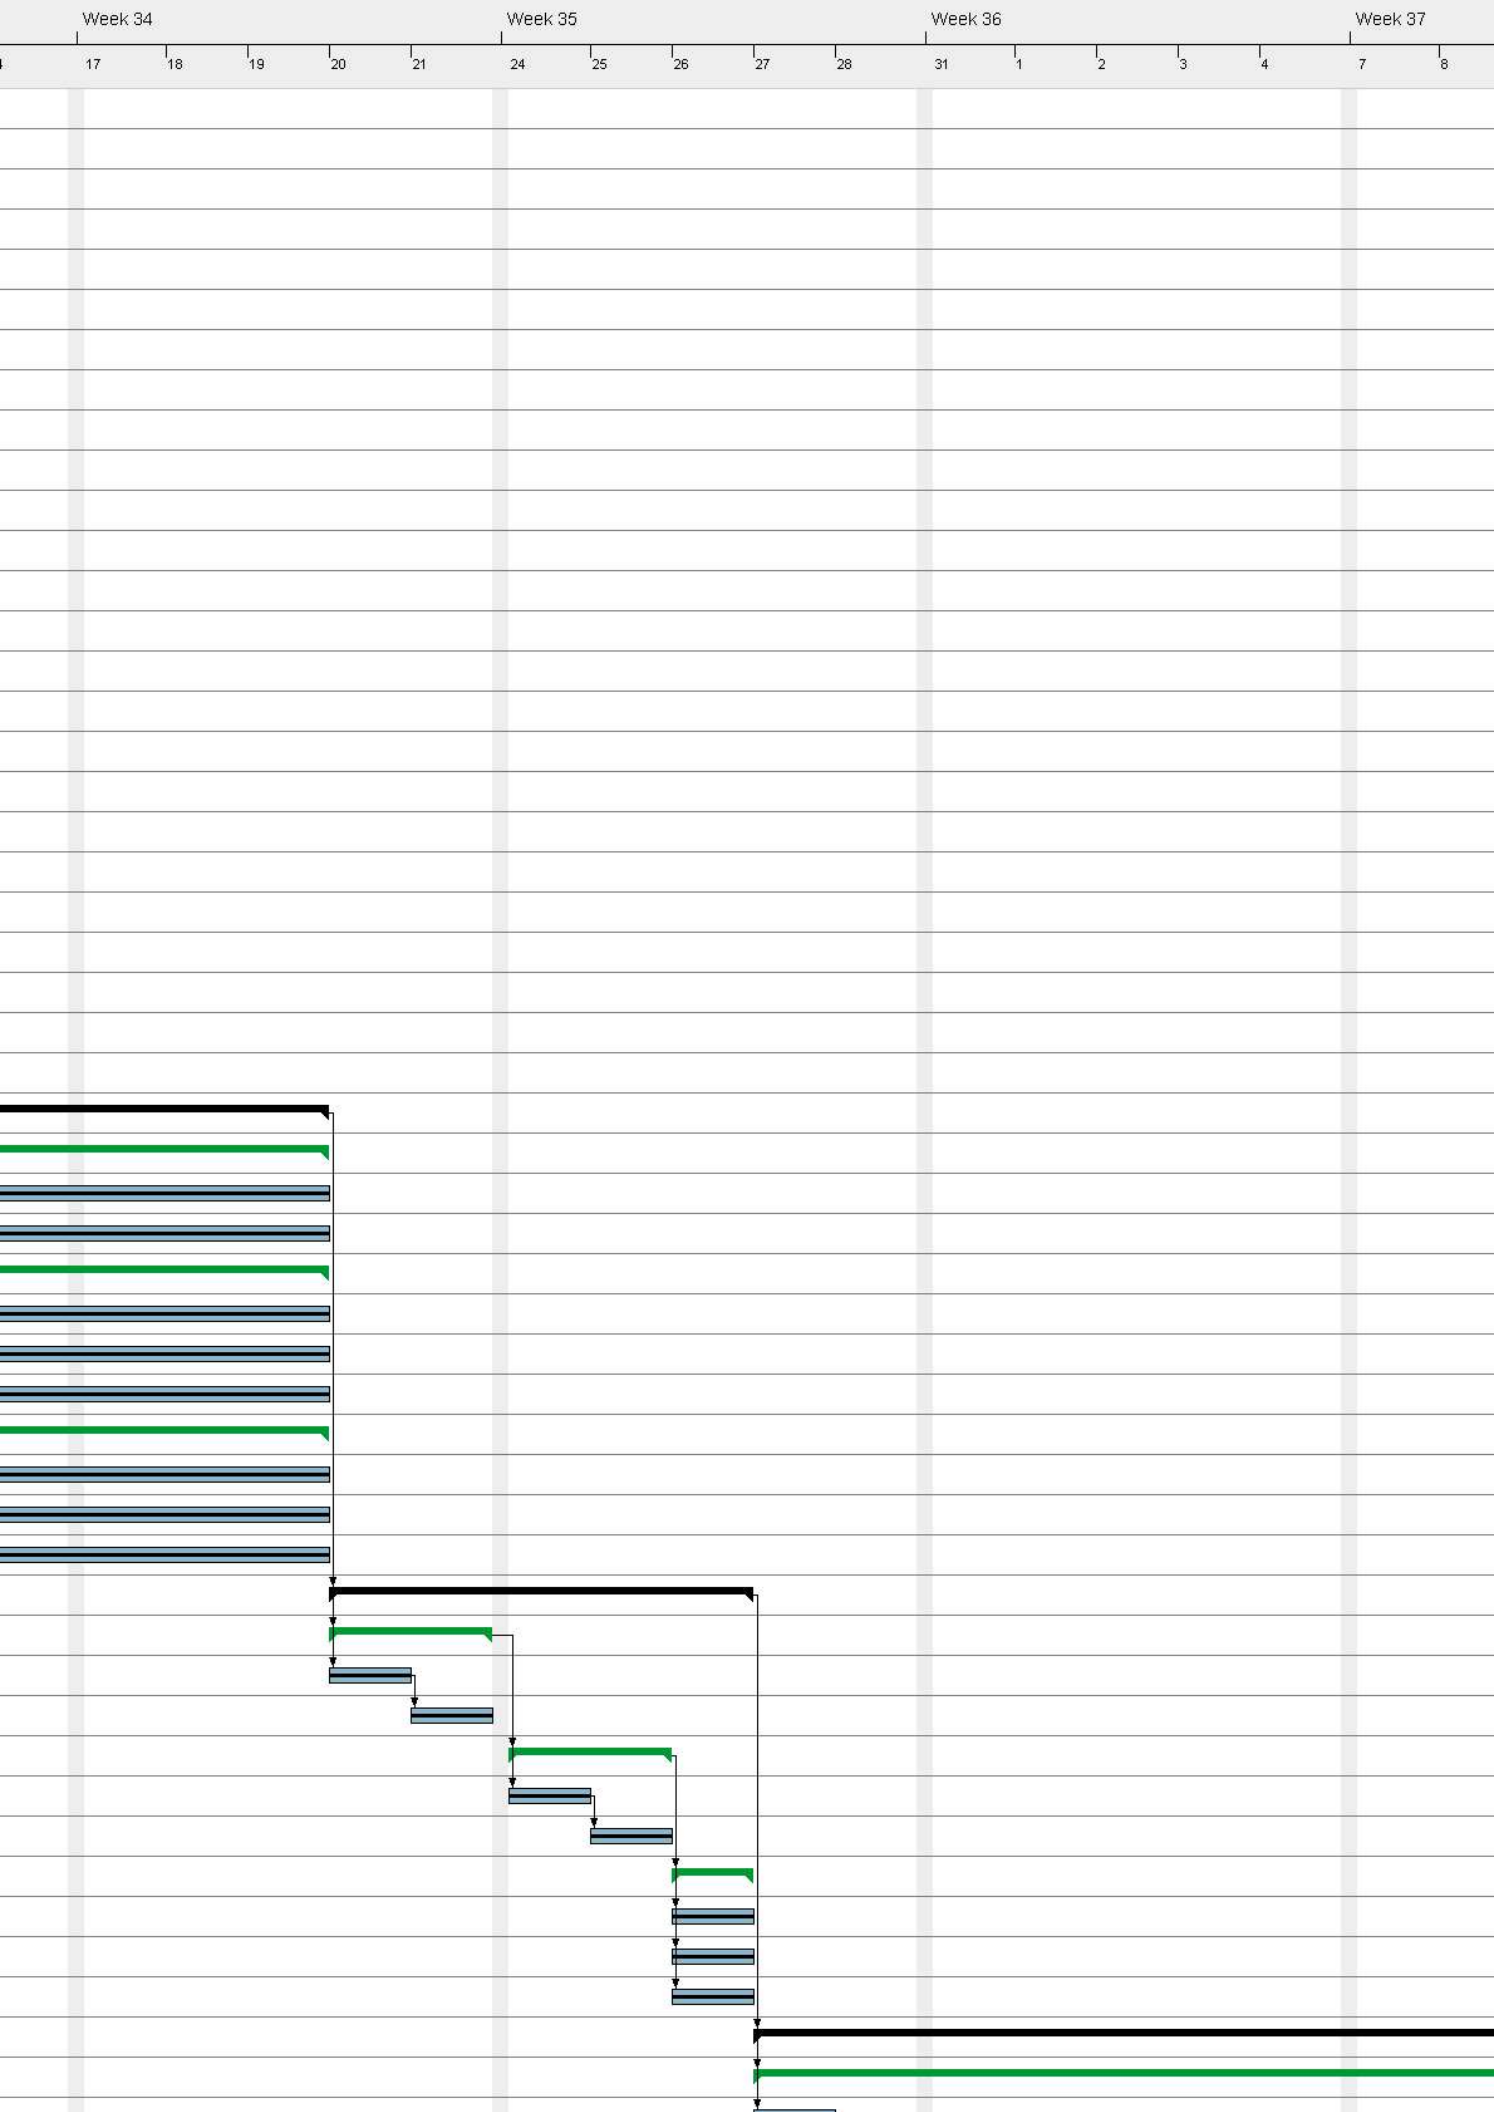


Name	Begin date	End date
1. Fase de Inicio	3/08/26	5/08/
1.1 Preparación Estratégica	3/08/26	3/08/
1.1.1 Revisión de políticas institucionales	3/08/26	3/08/
1.1.2 Identificación de stakeholders	3/08/26	3/08/
1.1.3 Entrevistas con Oficina de Inclusión	3/08/26	3/08/
1.1.4 Entrevistas con Departamento TI	3/08/26	3/08/
1.2 Definición del Proyecto	4/08/26	5/08/
1.2.1 Identificación de la problemática	4/08/26	5/08/
1.2.2 Definición de objetivos	4/08/26	5/08/
1.2.3 Definición del alcance	4/08/26	5/08/
1.2.4 Aprobación del proyecto	4/08/26	5/08/
2. Fase de Planificación	6/08/26	12/08/
2.1 Gestión del Proyecto	6/08/26	12/08/
2.1.1 Elaboración EDT	6/08/26	12/08/
2.1.2 Elaboración cronograma	6/08/26	12/08/
2.1.3 Estimación de recursos	6/08/26	12/08/
2.1.4 Estimación de costos	6/08/26	12/08/
2.2 Gestión de Riesgos	6/08/26	12/08/
2.2.1 Identificación de Riesgos	6/08/26	12/08/
2.2.2 Análisis de Riesgos	6/08/26	12/08/
2.2.3 Plan de Mitigación	6/08/26	12/08/
2.3 Planificación de Calidad	6/08/26	12/08/
2.3.1 Definición de criterios de aceptación	6/08/26	12/08/
2.3.2 Plan de pruebas	6/08/26	12/08/
2.3.3 Plan de accesibilidad WCAG	6/08/26	12/08/
3. Fase de Análisis	13/08/26	19/08/
3.1 Levantamiento de Requisitos	13/08/26	19/08/
3.1.1 Requisitos Funcionales	13/08/26	19/08/
3.1.2 Requisitos No Funcionales	13/08/26	19/08/
3.2 Estudio de Accesibilidad	13/08/26	19/08/
3.2.1 Análisis discapacidad visual	13/08/26	19/08/
3.2.2 Análisis discapacidad auditiva	13/08/26	19/08/
3.2.3 Estándar WCAG 2.1 AA	13/08/26	19/08/
3.3 Estudio del Campus	13/08/26	19/08/
3.3.1 Mapeo de zonas	13/08/26	19/08/
3.3.2 Identificación de puntos de interés	13/08/26	19/08/
3.3.3 Identificación de puntos de interés	13/08/26	19/08/
4. Fase de Diseño	20/08/26	26/08/
4.1 Diseño Arquitectónico	20/08/26	21/08/
4.1.1 Arquitectura del Sistema	20/08/26	20/08/
4.1.2 Arquitectura de accesibilidad	21/08/26	21/08/
4.2 Diseño de Datos	24/08/26	25/08/
4.2.1 Modelo de base de datos	24/08/26	24/08/
4.2.2 Diseño de contenidos multimedia	25/08/26	25/08/
4.3 Diseño de Interfaces	26/08/26	26/08/
4.3.1 Diseño de navegación	26/08/26	26/08/
4.3.2 Diseño responsive	26/08/26	26/08/
4.3.3 Diseño accesible	26/08/26	26/08/
5. Fase de Desarrollo	27/08/26	10/11/
5.1 Iteración 1	27/08/26	17/09/


Week 34
Week 35
Week 36
Week 37
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
31
1
2
3
4
7
8


Week 38
Week 39
Week 40
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
1
2

Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44


5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27



Week 45
Week 46
Week 47
28
29
30
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20

Week 48

23 24 25

5.1.1 RF-18 Registro de usuario	27/08/26	27/08/.
5.1.2 RF-19 Inicio de sesión (login)	28/08/26	28/08/.
5.1.3 RF-20 Roles y permisos	31/08/26	31/08/.
5.1.4 RF-21 Recuperación de contraseña	1/09/26	1/09/.
5.1.5 RF-22 Cierre de sesión	1/09/26	1/09/.
5.1.6 RF-23 Gestión de perfil	2/09/26	3/09/.
5.1.7 RF-24 Sesión persistente	2/09/26	2/09/.
5.1.8 RF-25 CRUD de usuarios	4/09/26	7/09/.
5.1.9 RF-34 CRUD de configuración	4/09/26	7/09/.
5.1.10 RF-37 Estados de publicación	8/09/26	9/09/.
5.1.11 RF-41 Gestión de sesiones activas	8/09/26	9/09/.
5.1.12 RF-42 Accesibilidad global por sesión	8/09/26	9/09/.
5.1.13 RNF-11 Seguridad de la plataforma	10/09/26	14/09/.
5.1.14 RNF-12 Protección de datos	15/09/26	15/09/.
5.1.15 RNF-13 Extensibilidad	15/09/26	15/09/.
5.1.16 RNF-15 Control de versiones	15/09/26	15/09/.
5.1.17 RNF-16 Software open-source	15/09/26	15/09/.
5.1.18 RNF-17 Inversión en hardware	16/09/26	17/09/.
5.2 Iteración 2	18/09/26	26/10/.
5.2.1 RF-01 Recorrido virtual 360°	18/09/26	28/09/.
5.2.2 RF-02 Modo accesibilidad por audio	29/09/26	2/10/.
5.2.3 RF-03 Modo accesibilidad LSC	29/09/26	2/10/.
5.2.4 RF-04 Modo accesibilidad táctil	29/09/26	5/10/.
5.2.5 RF-05 Subtítulos descriptivos	29/09/26	5/10/.
5.2.6 RF-06 Compatibilidad lectores de pantalla	29/09/26	2/10/.
5.2.7 RF-07 Interoperabilidad Braille	6/10/26	12/10/.
5.2.8 RF-08 Navegación por teclado	6/10/26	12/10/.
5.2.9 RF-09 Geolocalización indoor	6/10/26	13/10/.
5.2.10 RF-11 Perfil de accesibilidad configurable	6/10/26	9/10/.
5.2.11 RF-12 Gestión de contenidos (CMS)	6/10/26	13/10/.
5.2.12 RF-14 Interfaz responsive	14/10/26	23/10/.
5.2.13 RF-26 CRUD de tours 360°	14/10/26	23/10/.
5.2.14 RF-27 CRUD contenidos multimedia	14/10/26	23/10/.
5.2.15 RF-28 CRUD áreas/espacios	14/10/26	23/10/.
5.2.16 RF-29 CRUD metadatos de escena	14/10/26	23/10/.
5.2.17 RF-30 CRUD de beacons / zonas	14/10/26	23/10/.
5.2.18 RF-35 Búsqueda y filtros	26/10/26	26/10/.
5.3 Iteración 3	27/10/26	10/11/.
5.3.1 RF-10 Exportación de rutas en DAISY	27/10/26	30/10/.
5.3.2 RF-13 Gestión de usuarios	27/10/26	2/11/.
5.3.3 RF-15 Registro de uso	27/10/26	4/11/.
5.3.4 RF-16 Registro de incidencias	27/10/26	2/11/.
5.3.5 RF-17 Materiales de capacitación	27/10/26	4/11/.
5.3.6 RF-31 CRUD de incidencias	27/10/26	5/11/.
5.3.7 RF-32 CRUD materiales de capacitación	6/11/26	10/11/.
5.3.8 RF-33 CRUD de anuncios	6/11/26	10/11/.
5.3.9 RF-36 Panel de administración	6/11/26	10/11/.
5.3.10 RF-38 Auditoría y registro de actividades	6/11/26	10/11/.
5.3.11 RF-39 Respaldo y restauración	6/11/26	10/11/.
5.3.12 RF-40 API de gestión de contenidos	6/11/26	10/11/.
5.3.13 RNF-04 Alta disponibilidad	6/11/26	10/11/.
5.3.14 RNF-05 SLA de soporte	6/11/26	10/11/.
5.3.15 RNF-06 Mantenimiento evolutivo	6/11/26	10/11/.

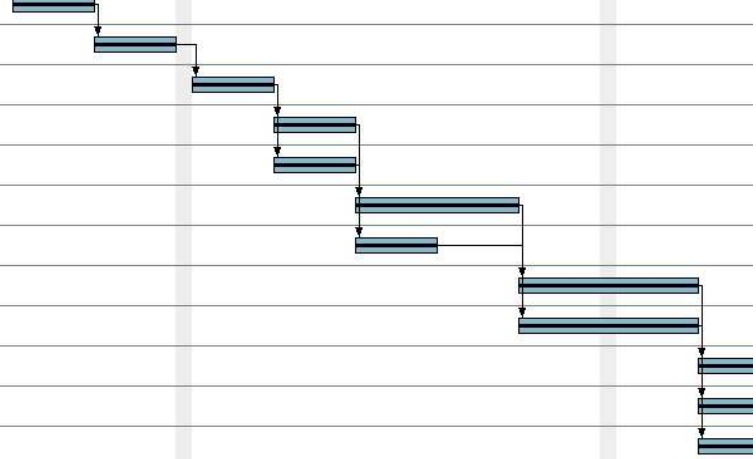

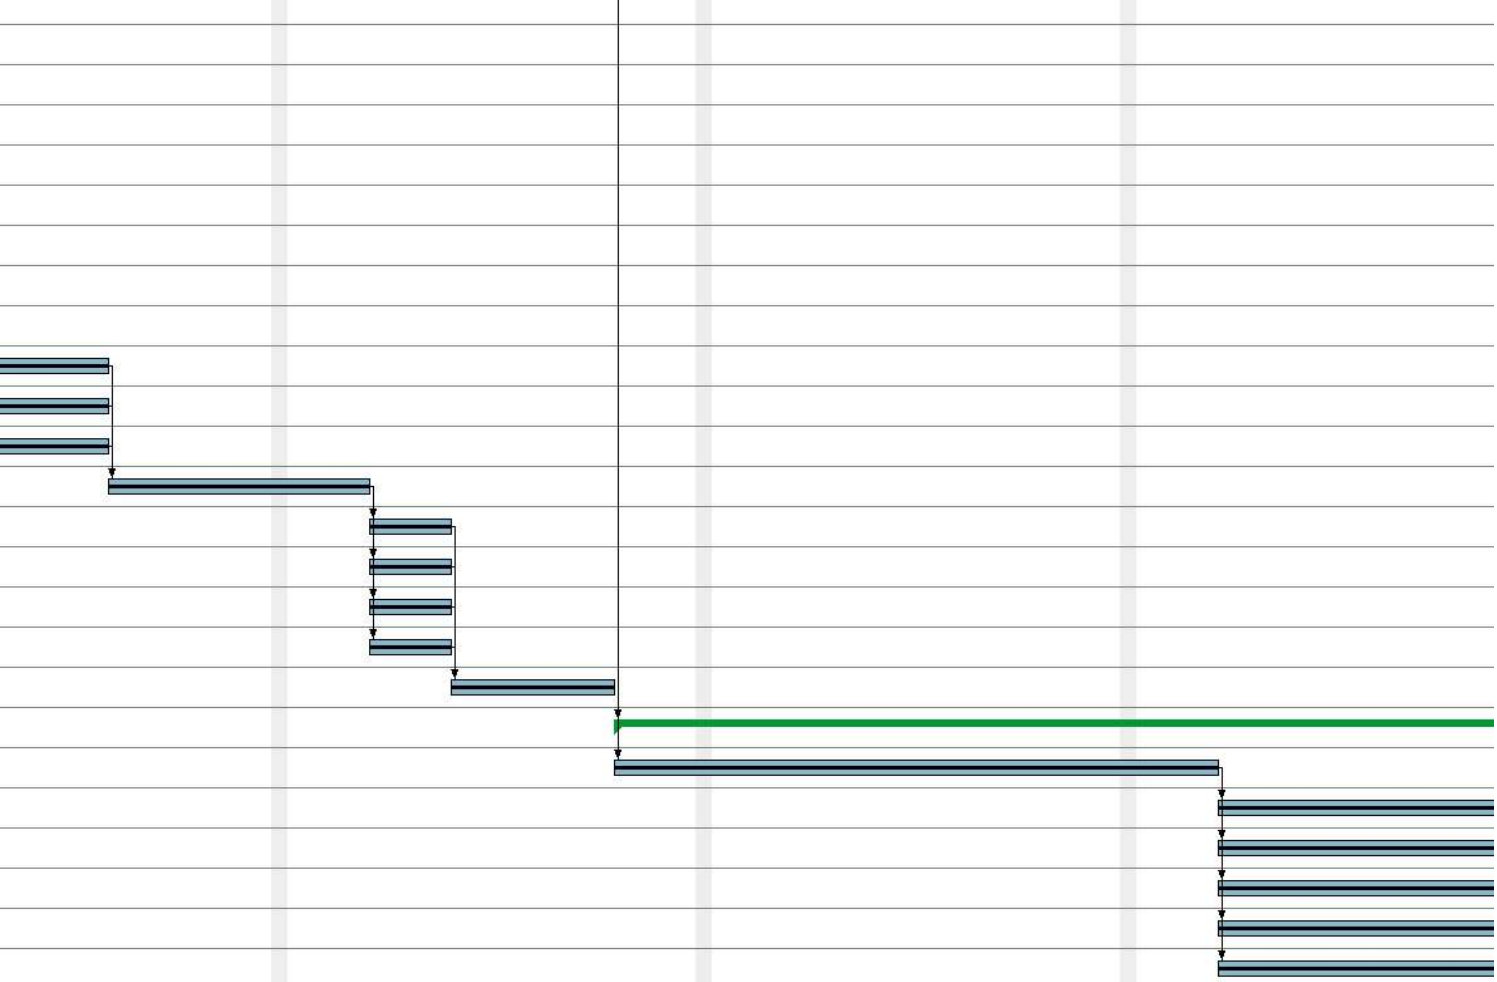





5.3.16 RNF-07 Cumplimiento WCAG 2.1 AA	6/11/26	10/11/.	
5.3.17 RNF-08 Validación automatizada	6/11/26	10/11/.	
5.3.18 RNF-09 Satisfacción del usuario	6/11/26	10/11/.	
6. Fase de Pruebas	11/11/26	17/11/.	
6.1 Pruebas de Iteración 1	11/11/26	17/11/.	
6.1.1 Pruebas de autenticación	11/11/26	17/11/.	
6.1.2 Pruebas de seguridad	11/11/26	17/11/.	
6.2 Pruebas de Iteración 2	11/11/26	17/11/.	
6.2.1 Pruebas de recorridos 360°	11/11/26	17/11/.	
6.2.2 Pruebas de accesibilidad	11/11/26	17/11/.	
6.3 Pruebas de Iteración 3	11/11/26	17/11/.	
6.3.1 Pruebas administrativas	11/11/26	17/11/.	
6.3.2 Pruebas de integración	11/11/26	17/11/.	
7. Fase de Implementación	18/11/26	25/11/.	
7.1 Despliegue	18/11/26	20/11/.	
7.1.1 Configuración del Servidor	18/11/26	20/11/.	
7.1.2 Publicación del Sistema	18/11/26	20/11/.	
7.2 Capacitación	23/11/26	25/11/.	
7.2.1 Capacitación Administradores	23/11/26	25/11/.	
7.2.2 Capacitación Usuarios	23/11/26	25/11/.	

